



Eijsden, 09-06-2008

Aan: De donateurs van SKIBRA

Betreft: Eindverslag over het project **Bouw van waterreservoir en Escola dos Anjos op het platteland van São Bento do Una, Pernambuco, Brazilië.**

Geachte donateur,

Met veel genoegen presenteren we u bij deze het eindverslag van bovengenoemd project, waarin u net als de subsidieverstrekkers een belangrijke bijdrage heeft geleverd door directe bijdrage in het project, door algemene donaties, ofwel door uw steun aan exploitatie van de Escola dos Anjos via ons programma Adopteer een Juf. Dat programma stelt SKIBRA in staat om in en rondom de nieuwe school ook werkelijk duurzame ontwikkelingshulp te bieden.

We hopen dat het resultaat en het verslag ook u tevreden stemt.

We danken u ook namens de Braziliaanse omwonenden (ouders, grootouders en kinderen) van de nieuwe school voor uw bijdrage en voor het door u getoonde vertrouwen!

Met hartelijke groet,
Stichting Kinderzorg Brazilië
(SKIBRA)

Gerard Popma
Voorzitter

Conselheiros Organizados da SKIBRA
(COSKIBRA)

Maria Quitéria Lima dos Santos
Penningmeester



Eindverslag van het project **Bouw waterreservoir en ESCOLA DOS ANJOS**

Locatie: Platteland van São Bento do Una, een gemeente met 45000 inwoners
Land: Noord-Oost Brazilië, Pernambuco

Project uitgevoerd door

- Stichting Kinderzorg Brazilië (SKIBRA, Nederland)
- Conselheiras Organizadas da SKIBRA (COSKIBRA, Brazilië)

Donaties (chronologische volgorde):

Scholengemeenschap Porta Mosana, Gronsveld (voorheen Jeanne d'Arc) met aanvullende bijdrage van Wilde Ganzen

Missiecomité Breust- Eijsden

Rotary Club Dedemsvaart-Ommen

Basisschool "De Lindegaerd", Meerssen-Rothem

en vele donaties door particulieren.

Subsidie: Nederlands Comité voor Duurzame Ontwikkelingssamenwerking (NCDO)

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
I. Het project in Brazilië.....	3
II. Aanpassingen.	3
III. Tijdplanning en de praktijk.....	4
IV. Uitvoering	5
V. Evaluaties	7
VI. Follow-up	8
VII. De financiële verslaglegging.....	9
VIII. Enkele foto's van het project.....	12

I. Het project in Brazilië

De uitvoering van het project werd geheel gedaan door COSKIBRA, de Braziliaanse zusterorganisatie van SKIBRA. Deze droeg zorg voor de planning, de inhuur van Braziliaanse werklieden en de inkoop van materialen en inrichting.

Afspraken en samenwerking met de uitvoerende partner COSKIBRA

- De schets van de te realiseren constructies is in Nederland gemaakt door SKIBRA
- Met de aannemer en andere dienstverleners is door COSKIBRA een prestatiecontract opgesteld waardoor zowel de arbeidskosten duidelijk vooraf afgesproken waren evenals de evenredige verdeling daarvan over het project.
- Er is aan de uitvoerend projectleidster in Brazilië een projectadministratie (in Microsoft Excel) ter beschikking gesteld waarin de dagelijkse inkomsten en uitgaven verantwoord konden worden.
- Er is voortdurend gewezen op de verschuldigde rapportage aan de donateurs en de daarvoor benodigde kwaliteit van de administratie.
- Er is vanuit Nederland door SKIBRA voortdurend (bijna dagelijks) contact onderhouden met de partnerorganisatie.
- In de maand januari van de jaren 2006, 2007 en 2008 is door SKIBRA actief deelgenomen aan de uitvoering van het project in Brazilië.


De projectdoelen

De oorspronkelijke doelstellingen waren:

- a. Aanleg waterreservoir van 40.000 liter
- b. bouw van de Escola dos Anjos op het platteland van São Bento do Una

De projectdoelen zijn conform plan gehaald.

II. Aanpassingen.

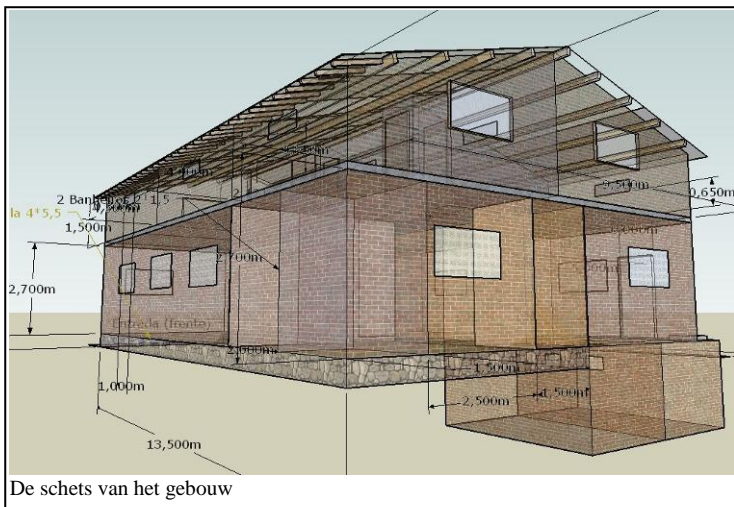


Tijdens de bouw zijn enkele aanpassingen doorgevoerd in verband met de plaats van de watertank op het dak en de hoogte van de bovenverdieping. In eerste instantie was de bedoeling de bovenverdieping slechts als opbergplaats te gebruiken waar ook de watertank kon staan. In de loop van het traject is de overtuiging gevormd dat een functioneel ingerichte bovenverdieping de bruikbaarheid van het gebouw enorm zou vergroten tegen betrekkelijk weinig meerwerk / meerkosten. Bij de discussies bleek de 3D-schets van het gebouw heel waardevol te zijn in de discussies met de

bouwmedewerkers, die niet konden lezen, maar wel plaatjes konden begrijpen. Er werd ook besloten om het dak te construeren met gebruik van dakplaten, zodat er geen ongewenst bezoek

van dieren en inbrekers via het dak kan plaatsvinden.

III. Tijdplanning en de praktijk

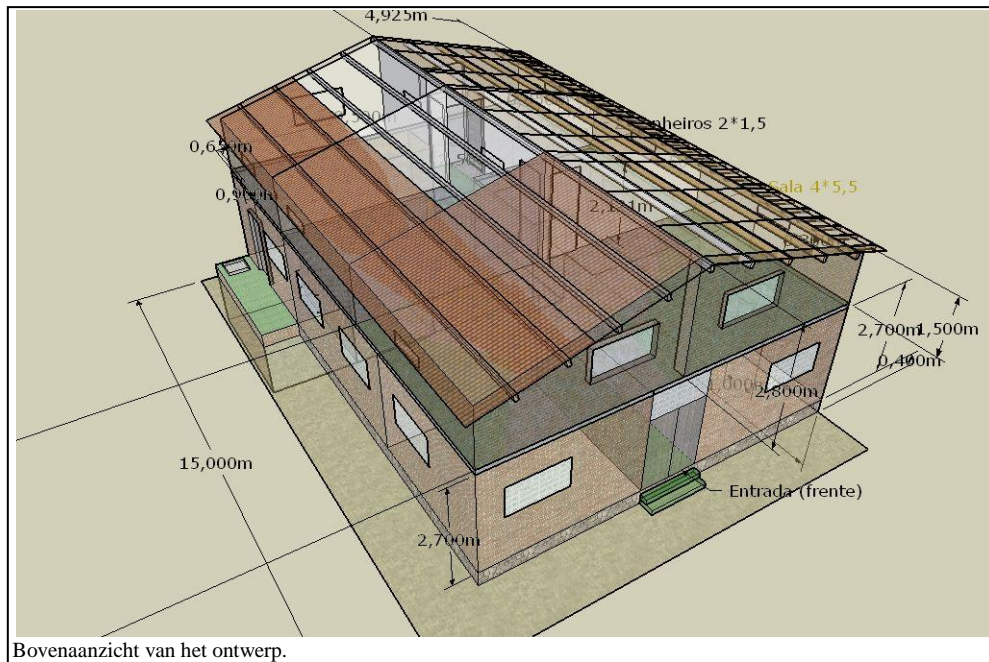

Bovenaanzicht van het ontwerp.

De oorspronkelijk ingeschatte projectduur was 1,5 jaar. Door typisch ‘Braziliaanse’ omstandigheden is de projectduur enorm tegengevallen.

- In eerste instantie had dat te maken met het legaliseren van de bouwgrond. Gelukkig was de koopovereenkomst met juridische assistentie afgesloten vóór het overlijden van de verkopende partij, anders was de vertraging wegens erfrecht kwesties nog groter geweest. De verkopende eigenaar had niet de benodigde eigendomsbewijzen. Daardoor was er een langdurige juridische procedure (USUCAPIÃO) nodig die liep van december 2004 tot januari 2006. Gevolg was dat NCDO de reeds overgemaakte subsidie terugvorderde.
- Na formele afsluiting van de USUCAPIÃO procedure werd na hernieuwde aanvraag alsnog subsidie door het NCDO verstrekt. In de tussentijd kon formeel niet gestart worden met de bouw.
- Het wachten was toen weer op de beschikbaarheid van de beoogd aannemer, die ongeveer de enige in de wijde omgeving was.
- Bij de bouwwerkzaamheden zijn op diverse momenten vertragingen ontstaan. Soms door overvloedige regenval (regenseizoen), soms door ontbrekende materialen of het niet beschikbaar zijn van de aannemer of vakmensen. Al met al werd pas in januari 2008 de laatste hand gelegd aan de werkzaamheden. Als er gewerkt kon worden ging het vaak ook heel snel. Uiteindelijk is het gebouw in januari 2008 opgeleverd en in gebruik genomen, nét voor de aanvang van het nieuwe schooljaar en precies 10 jaar na in gebruikname van de eerste Escola dos Anjos in Recife.

IV. Uitvoering

De uitvoering van het project is vanuit Nederland op de voet gevolgd door SKIBRA. Het werk werd uitgevoerd door Braziliaanse werklieden onder regie van de COSKIBRA. De voorzitter van COSKIBRA (Maria Quitéria Lima dos Santos) was de projectleidster en representante van de doelgroep, SKIBRA voorzitter (Gerard Popma) had de rol van ‘Project Director’ die ook toezag op de kwaliteit van toe te passen materialen en werk(planning), terwijl de aannemer, Senhor Liu, in het project ook de rol van ‘Technisch Adviseur’ had. Hij nam de verantwoordelijkheid voor de deugdelijkheid van de constructie en adviseerde de projectleidster omtrent materiaal aankoop. Hoewel er best veel aandachtspunten (“issues”) waren mogen we toch constateren dat iedereen 100% gemotiveerd en betrokken zijn steentje bijdroeg en het resultaat er uiteindelijk een is om trots op te zijn.



Bijzondere aandachtspunten betreffende de projectuitvoering in Brazilië (waar hadden we het zoal over tijdens het project....)

a. Kwaliteit materialen

De kwaliteit van stenen en dakpannen liet veel te wensen over. Veel stenen en dakpannen braken al bij het stapelen. Ook werd in eerste instantie geprobeerd om niet-watervaste dakplaten als watervast te verkopen aan de projectleidster. Gelukkig kent zij als Braziliaanse de gang van zaken en was ze alert. Geleverde houten balken waren in eerste instantie van inferieure kwaliteit: de leverancier moest nieuwe leveren (na een ferme toespraak).

b. Kwaliteitsbesef bij de uitvoerende werklieden.

De werklieden, allen uit de directe omgeving van het project, werkten zeer goed maar de afwerking liet vaak te wensen over. Zo werden na het witten van de plafonds niet de muren en ramen schoongeveegd. Hetzelfde met betrekking tot schilderwerk van de traliehekken (ook ruiten en muren werden bespat) en met betrekking tot voegen van tegelwerk (de tegels werden niet schoongeveegd) was een tegenvaller die extra werk opleverde.

Op een gegeven moment begon op te vallen dat de aannemer van gekochte materialen steeds beweerde dat ze niet ‘eerste keus’ waren. Het gevoel ontstond dat hij daarmee indekgedrag vertoonde. Het project was in 9 fasen verdeeld. Dat bleek een uitkomst voor de projectleidster om regelmatig kwaliteitscontroles uit te voeren. Frequent toezicht was zeer nodig, dus moest ze regelmatig de school in Recife aan de leerkrachten overlaten omdat ze naar de bouw in het binnenland moest.

c. Normen en waarden / cultuur / veiligheid.

Het was voor de projectleidster te risicovol om met de werklieden in discussie te gaan over kwaliteitspunten. Zij voelde zich dan niet veilig. Daarom ook werden die punten vooral met



de aannemer besproken. Evenmin veilig was dat door het ontbreken van bankkantoren of geldautomaten, de projectleidster altijd met contant geld op zak naar het project moest. Gelukkig is dat altijd goed gegaan, door onaangekondigd te verschijnen.

d. Communicatie en afstand.

Door de grote afstand tussen de woonplaats van de projectleidster (Recife) en de bouwplaats was het haar niet mogelijk dagelijks op de bouw aanwezig te zijn. Het voordeel daarvan was dat zij in Recife veel materialen kon kopen of laten maken (traliehekken, stalen buitendeuren, schoolmeubilair, tegels) die in São Bento niet voorhanden waren. Het nadeel was dat zij niet altijd op tijd geïnformeerd kon worden, door het ontbreken van telefoonlijnen en een de slechte kwaliteit van GSM verbindingen op het platteland. Wel was er op het werk een vertrouwenspersoon aanwezig die het werk kon monitoren.

De projectleidster ging indien nodig met de bus (reisduur 4 uren) naar São Bento do Una, voor het betalen van de werklieden en voor de aankoop van materialen bij lokale bouwmarkten.

e. Beschikbaarheid van bouwbedrijven

Er is in São Bento do Una geen aannemersbedrijf. Na lang zoeken vond de projectleidster een goede metselaar die de aannemersrol op zich nam en assistenten inhuurde.

f. Frictie tussen betalen 'per week' of betalen 'per resultaat'

De aannemer drong tijdens de werkzaamheden toch steeds aan op wekelijkse betaling, hoewel hij accoord was gegaan met betaling 'per tussenresultaat'. Gaande de werkzaamheden bleek dat de man niet kon lezen of rekenen.

g. Beveiliging van materialen en 'just in time' aankoop van materialen

Het risico van diefstal was zo groot dat de projectleidster zich genoodzaakt zag om gedurende de bouwactiviteiten een nachtwaker in te huren. Dit waren onvoorziene kosten.

h. Beschikbaarheid van materialen.

- Dakpannen en (holle) stenen waren in eerste instantie niet in voldoende mate beschikbaar in de handel.

- Aangezien men in Brazilië niet gewend is de daken met dakplaten te maken waarop vervolgens regelwerk en dakpannen gelegd worden, was het heel moeilijk om aan de juiste platen te komen. Na een lange zoektocht werden de platen gevonden in Recife, 225 Km verwijderd van de bouwlocatie.

i. Overige opmerkingen:

- Sommige materialen moesten bij verschillende leveranciers in Belo Jardim en in São Bento bij elkaar gesprokkeld worden omdat de leverancier niet alles op voorraad had. Zelfs de eerste series bakstenen voor het waterreservoir konden niet als één partij geleverd worden door de fabrikant.

- Onder andere dakplaten, vloer/wandtegels, schoolmeubilair, traliewerk en stalen toegangsdeuren, moesten noodgedwongen ingekocht worden in Recife, 225 Km verderop, omdat ze op locatie in het binnenland niet of in onvoldoende kwaliteit verkrijgbaar waren. Een andere reden voor het kopen al naar gelang de vordering van het werk was het risico voor diefstal en het risico van rondlopen met contant geld.

- Het gebruik van creditcards (waarvan de opnames rechtstreeks in Nederland werden afgeboekt) is toegepast waar mogelijk. Waar dat niet kon is gebruik gemaakt van cheques ten laste van het banksaldo van COSKIBRA of van contant geld dat met de Rabo Mastercard van SKIBRA werd afgehaald in Recife. Helaas is in het binnenland geen geldautomaat beschikbaar binnen een straal van 100 Km.


V. Evaluaties

Voortdurend vinger aan de pols!

- Het project werd gedurende de looptijd kortcyclisch gemonitord, zowel vanuit Recife en São Bento als vanuit Nederland. Door de directe internetverbinding kon snel gereageerd worden op situaties waarin dat nodig was. Gelukkig was er geen taalbarrière...
- Het project is door Skibra en Coskibra geëvalueerd na de inauguratie, januari 2008. Conclusie was dat het werkelijk een tropenklus is geweest, die bijzonder veel aandacht eiste aan weerszijden van de oceaan, maar dat het resultaat er zijn mag. Niet alleen de direct betrokkenen in Brazilië zijn trots op hun prestatie, ook de omwonenden (de doelgroep) zijn trots op “hun” school, en “hun” waterreservoir. Dit bleek tijdens evaluatiegesprekken bij de inauguratie van de school op 8 januari 2008. De mensen zitten boordevol ideeën over het benutten van het gebouw, bijvoorbeeld voor alfabetisering van volwassenen en jongvolwassenen, maar ook als trefcentrum en als medische post. Ook is er overleg met de gemeente São Bento over het inrichten van een politiepost op het terrein van de Escola dos Anjos. Brede School Ontwikkeling en partnerschap met derden is niet alleen een thema in Nederland....
- Evaluatie met de medewerkers staat nog op het programma, na afwikkeling van de projectrapportage wordt met alle direct betrokkenen de evaluatie uitgevoerd.



Bijstellingen

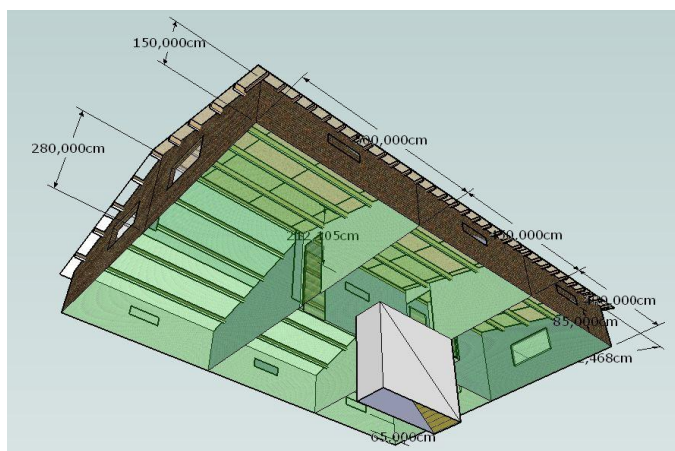

Tussentijdse evaluatie heeft op onderdelen geleid tot bijstelling, zoals details in de bouw (iets hogere muren bovenverdieping waardoor deze veiliger en beter bruikbaar werd). Ook waren enkele punten ter invulling gelaten omdat die in overleg met de aannemer zouden worden besloten (bv. vorm en constructie van de trap, plek en wijze van plaatsing van waterreservoir op het dak).

Links: Onderaanzicht van de gewijzigde bovenverdieping later werd deze nog verhoogd tot 1.80 m



VI. Follow-up

Onderwijs, Opvoeding en Zorg

Het bouwproject is afgerond. Het echte werk is begonnen in februari 2008. De continuïteit wordt gewaarborgd, op basis van de donaties die SKIBRA daarvoor in de toekomst ontvangt. De duurzame ontwikkelingshulp vanuit en rondom de Escola dos Anjos wordt geheel door SKIBRA vanuit Nederland geregisseerd en gefinancierd (activiteiten op het gebied van volwassenenonderwijs, gezondheid, communicatie, veiligheid en landbouw).

De COSKIBRA in Brazilië zorgt voor uitvoering, monitoring en rapportage. De lessen aan de schoolkinderen worden nog gegeven door leerkrachten van Coskibra. Met de burgemeester en de afdeling onderwijs van de gemeente zijn afspraken gemaakt dat de gemeente São Bento do Una zorgdraagt voor het onderwijs en de voeding van de schoolkinderen.

De waterleidingmaatschappij (COMPESA) heeft op verzoek van Coskibra een waterleiding van 1,5 Km aangelegd waarop het waterreservoir is aangesloten. Coskibra heeft kunnen regelen dat er geen watermeter geplaatst werd maar dat uitsluitend een vastrecht van 7 Euro per maand verschuldigd is.

Programma

Vanaf 2008 zullen projecten gestart worden enerzijds rondom de school (extra waterreservoir voor regenwater ten behoeve van landbouw en veeteeltprojecten, de bouw van een gemeenschapshuis in São Bento do Una zelf en een proefproject voor fruitteelt op het terrein van de Escola dos Anjos.

De projecten zullen direct of indirect betrekking hebben op de eerste 7 millenniumdoelen (zie afbeelding).

Realisatie lange termijn doelstellingen

De lange termijn doelstellingen zijn een betere scholing, opvoeding en hygiëne in de school en in de gezinssituaties. Verder zijn de doelstellingen gericht op gezondheidszorg, verminderen kindersterfte en mogelijkheden voor economische ontplooiing. Gezien de enorme betrokkenheid en ideevorming bij de omwonenden verwachten we de lange termijn doelstellingen (bijdrage aan de Millenniumdoelen van de VN) op deze kleine schaal te kunnen realiseren, naast een uitbanning van analfabetisme.





VII. De financiële verslaglegging

De uiteindelijke inkomsten

Het inzamelingsresultaat:		
De bijdrage van NCDO	25.000	01-2006
Schoolactie Jeanne d'Arc	2.500	08-2003
Premie van Wilde Ganzen	818,75	08-2003 premie op actie Jeanne d'Arc
Missie Comité Breust-Eijsden	10.000	09-2003
Rotary Club Dedemsvaart-Ommen	7.250	07-2005 (uitgekeerd in 2007)
Particuliere giften donateurs en eigen reserve voor projecten	13.930	2004-2007
Totaal	59.498,75	

De uiteindelijke uitgaven

De bestedingen (in R\$ Braziliaanse Reais) Gemiddelde koers over 110 transacties met mastercard en 4 overboekingen vanaf postgiro is 2,68 Real per Euro. De koers varieerde tussen 2,50 en 3 real per Euro. De omrekening naar Euros is dus niet het exact bestede bedrag in Euros.				
Kostengroep		Begroot	Besteed	Euro's besteed *)
Terrein		14.250	11.976	4.468,66
Gereedschappen		3.348	3.543	1.322,01
Bouwmaterialen (Stenen, cement e.d.)		32.094	51.592	19.250,75
Hidraulica		10.343	2.010	750
Leidingwerk		3.454	1008	376,12
Electrische installatie		3.367	2.786	1.039,55
Ijzer		7.893	11.588	4.323,88
Electrische apparatuur		3.395	3.953	1.475
Hout		17.184	10.693	3.989,93
Inrichting		9.287	17.074	6.370,9
Projectkosten	Projectleiding, inkoop, rapportage	6.600	8.886	3.315,67
	Directe Arbeidskosten (metsel&installatiewerk)	15.300	17.850	6.660,45
	Transport-kosten	2.250	5.700	2.126,87
	Electrische Installatie en energie	1.500	2.613	975
Niet begroot: Beveiliging		0	3.100	1.156,72
Afwerking		0	2.080	776,12
Grondwerk		0	2.070	772,39
Diverse kleine kosten		0	931	347,39
Totaal van de kosten		130.265	159.453	59.497,39
*) Gemiddelde koers voor omrekening		R\$ 268/100 €		



Afwijkingen ten opzichte van begroting:

De post Hidraulica bevatte in de oorspronkelijke begroting ook de aanleg van het waterreservoir en een reservoir voor opvang van afvoerwater uit keuken, douche en toiletten, bij gebrek aan riolering (samen een post van 6500 real). In de rapportage zijn deze kosten verwerkt onder 'Bouwmaterialen', ijzer en arbeidskosten.

Het **verbruik van cement was hoger** dan door de aannemer (metselaar) vooraf ingeschat. De **dakconstructie** werd op aangeven van SKIBRA degelijker uitgevoerd dan in het oorspronkelijke ontwerp voorzien. Dit in verband met hygiëne en veiligheid. Ook om reden van veiligheid en beveiliging van waardevolle apparatuur en functionaliteit werd de **bovenverdieping een meter hoger** uitgevoerd dan begroot. Dit op dringend verzoek van de partner in Brazilië. Hierdoor vielen arbeidskosten en verbruik van bouwmaterialen (stenen, tegels, cement) hoger uit.

Op basis van signalen van omwonenden moest besloten worden om een **nachtwaker** op de bouwplaats aan te stellen.

Het een meter brede terras **rondom de school** moest vanwege de helling waarop de school staat rondom met gemetselde muren waterpas gelegd worden. Dat was niet voorzien bij het ontwerp. Ook hiervoor waren meer stenen en cement nodig. Het terras is dringend nodig om modder buiten te houden en om te zorgen dat hevige regens in het regenseizoen niet meteen de schoolfundamenten aantasten.

De afwijkingen zijn in intensief overleg met SKIBRA doorgevoerd.

Bijdrage van Rotary Club Dedemsvaart-Ommen.

De opbrengst uit de door Rotary Club Dedemsvaart-Ommen in 2005 georganiseerde High Tea (€7.250) is op verzoek van de Rotary vooral besteed aan inrichting van de nieuwe Escola dos Anjos, onder meer aan:

- Meubilair in de klaslokalen, krijtborden
- Radio/karaoke, TV/DVD en Sateliet-ontvanger
- Opbergrekken, kasten, wasmachine, Computer, Bureau's, Printer/copier
- Schrijfmateriaal, Keukengereedschap
- Waterpomp





Reflectie SKIBRA

Dankzij de steun van vele donateurs en het doorzettingsvermogen van de projectleiding in Brazilië is dit project tot een goed einde gekomen. In Nederland is met name de steun van het Missie Comité Breust-Eijsden, De Rotary Club Dedemsvaart-Ommen en het Porta Mosana College met een aanvulling door Wilde Ganzen van groot belang geweest om ook van de NCDO subsidie te krijgen voor dit project.



Uit erkentelijkheid aan de grote bijdrage (10.000 Euro aan het project) van het Missie Comité hebben de voorzitter van SKIBRA en zijn 4 zonen enkele jaren meegeholpen met het maandelijks ophalen van oud papier in Eijsden.



Een volgend project zal in kleinere afzonderlijke delen (administratief) worden geïnitieerd en afgewerkt. Een project van deze omvang zullen we ook zeker niet elk jaar zelf (in eigen regie) uitvoeren. De beschikbaarheid van vakmensen en materialen is een sterk belemmerende factor. In de komende jaren gaat onze aandacht vooral uit naar Millenniumdoelen en opvoeding, onderwijs en zorg vanuit de nu gecreëerde faciliteiten.

Voor de start en begeleiding van nieuwe projecten is het gebouw van de nieuwe ESCOLA DOS ANJOS een perfect coördinatiecentrum. Eén ruimte in de bovenverdieping van het gebouw is daarom ingericht als kantoor voor de COSKIBRA. Als er nu nog een telefoonverbinding (dus internet) was

De volgende pagina's bevatten enkele foto's van het bouw project.

VIII. Enkele foto's van het project



De eerste blik op het terrein, in de regentijd.



Het is al droger in januari 2006, er kan gegraven worden voor aanleg van het waterreservoir. Scheppen, bikkels en kruitwagens werden betaald uit de bijdrage van Jeanne d'Arc / Wilde Ganzen. Het is niet alleen basis voor de Escola dos Anjos, maar ook voor activiteiten die vanuit deze school in São Bento do Una en voor de plattelanders van Sítio Logradouro worden ontwikkeld.



Maar als de regentijd aanbreekt kun je niet verder...



Intussen gaan we in Nederland gewoon verder met acties, hier met het thema "Kinderen van de wereld" met fotuitwisseling tussen basisschool De Lindegaard en de Escola dos Anjos



Het dak van het waterreservoir is tegelijk ook de vloer van de keuken in de Escola dos Anjos. De eerste partij lateien, 'broodjes' en betonijzer worden verwerkt in het reservoir. De betonmolen bewijst goede diensten, maar paard en wagen zijn onmisbaar ...

Als de fundering er ligt schieten de eerste muren omhoog. Het gaat snel en er wordt met man en macht gewerkt om de boel dicht te hebben vóór de regentijd begint.



De vloer van de eerste verdieping wordt gelegd. Ook hier weer veel cement, betonijzer en lateien nodig. .





De traliehekken, stalen deuren en aluminium kozijnen gaan op transport van Recife naar São Bento. Dit is ook zo gegaan met tegels, sanitair, dakplaten (drie vrachtwagens), meubilair en speeltoestel



Na het plaatsen van de ramen wordt gestart met het betegelen van binnenmuren.



De Escola dos Anjos (jaja, de naam moet er nog op) is helemaal klaar. De laatste installaties werden nog in januari 2008 uitgevoerd. Maar de lessen kunnen met de start van het nieuwe schooljaar (februari 2008) starten.



De recreatiezaal van de Escola dos Anjos is op de eerste verdieping, onder een echt 'Hollands' dak met dakplaten en stevige draagbalken. Een noviteit in São Bento maar het voorkomt dat vogels en ander ongedierte vrijelijk in en uit vliegen! Zelfs aan gordijnen is gedacht.



Een doorkijkje in een van de leslokalen, inclusief Nederlandse vlag!



Misschien ontbreekt er nog een werktafel, maar het 6-pits fornuis is kennelijk multifunctioneel. Rechts een waterkoeler



De opening van de school was niet alleen gezellig maar ook een heel belangrijk moment voor de project-verantwoordelijken. Ondanks stevige stalen buitendeuren en ruiten in alle ramen, zijn alle openingen in het gebouw nog eens beveiligd met tralies, om het ongewenst bezoek zo moeilijk mogelijk te maken.



Enmaal binnen is het ondanks de tralies toch gezellig. Zelfs aan gordijnen is gedacht.

Een blik in een van de volledig betegelde leslokalen. Het bord moet nog opgehangen worden, maar dat mag de pret niet drukken.





De directrice (L) op kantoor in de Escola dos Anjos in gesprek met de 4 vrouw sterke delegatie van de Gemeente São Bento do Una.

Onderwerp: wat gaat de Gemeente bijdragen.....
